Stratégie de test – Projet TOMSEN

Application de gestion financière PayForge

Version	v1.1
Date	21/01/2026
Auteur	AOMAR BOUKERSI - Consultant Test (PayForge)
Destinataires	Elsa (Product Owner), Alice (Scrum Master / Lead Tech), Quentin (Bureau d'étude)
Méthodologie	Agile (sprints)
Objectif qualité	100% de validation sur fonctionnalités critiques ; 85% sur majeures / mineures
Approuvé par	Elsa (Product Owner)

Table des matiere:

1. INTRODUCTION 1

1.1 APERÇU DU DOCUMENT 1
1.2 PREFACE 1

2.SCÉNARIOS PRÉVUS 2

3.MÉTHODES DE TEST ADAPTÉES 3

4.RESSOURCES NÉCESSAIRES 4

5.ÉTAPES CLÉS DE LA STRATÉGIE 5

6. PROCESSUS DE TEST 6

6.1 ORGANIGRAMME 6

7. RISQUES DU PROJET 6

7.1 LISTE DES RISQUES 6
7.2 CRITIQUE DES EXIGENCES 7

8.PRÉCONISATIONS 7

9. ANNEXES 8

9.1 GLOSSAIRE 8
9.2 LISTE DES CONFIGURATIONS À TESTER 8

1. INTRODUCTION

1.1 Aperçu du document

Ce document décrit l'approche de test retenue pour le projet TOMSEN (PayForge). Il précise le périmètre, l'organisation des tests dans une approche Agile, les risques, les environnements, ainsi que les livrables attendus. Il sert de référence partagée entre Produit, Développement, Conformité et QA.

1.2 Préface

Les avantages d'une stratégie de test sont les suivants :

- Garantir la qualité du projet et veiller à ce qu'il réponde aux exigences définies dans les spécifications.
- Concentrez-vous sur des caractéristiques spécifiques du système
- Comprendre les fonctionnalités d'un projet numérique
- Atténuer les risques

La stratégie QA gérée par les équipes métier et informatique est un facteur crucial pour atteindre les objectifs suivants :

- Un bon rapport qualité-prix pour les invités DLP
- Améliorer la performance de l'entreprise
- Intégration sans faille avec les nouvelles technologies

Agilité et adaptabilité accrues à toute solution.

• Élément	• Description
• **Produit**	• Application de gestion financière pour particuliers : création de compte, KYC, connexion bancaire, tableau de bord, suivi de consommation, conseiller virtuel.
• **Contraintes**	• Livraison prévue sous 4 mois ; absence totale d'historique de tests.
• **Exigences qualité (PO)**	• 100% de tests validés sur les fonctionnalités critiques ; 85% de taux d'acceptation sur les fonctionnalités majeures et mineures.
• **Non-régression**	• Campagne de non-régression en fin de projet sur les fonctionnalités critiques, en raison d'un risque d'interférences avec des développements réalisés par une autre équipe.

PayForge

2.Scénarios prévus

Tableau récapitulatif des scénarios de test prévus pour la V1 (basés sur les exigences TOM01 à TOM15 et les questions critiques identifiées).

Sprint	Domaine / Parcours	Fonctionnalité (TOM)	Priorité test (proposée)	Résultat attendu (1 phrase)	Dépendances / prérequis
01	Onboarding / Compte	Création de comptes utilisateurs sécurisés (TOM06)	**Critique**	Créer un compte avec règles de saisie + mot de passe conforme, puis accéder à l'étape suivante.	**Aucune (début de parcours)**
01	KYC	Téléversement des pièces justificatives (TOM07)	**Critique**	Téléverser les justificatifs via l'OS, visualiser les listes (à fournir / en cours / téléversés) et gérer annulation.	**Compte créé (TOM06)**
01	Authentification	Authentification double facteur (TOM08)	**Critique**	Sécuriser la connexion et les actions sensibles via un second facteur d'authentification.	**Compte existant + service SECU disponible**
01	Authentification	Authentification biométrie (TOM09)	**Haute**	Permettre l'authentification par biométrie (si disponible) avec fallback sécurisé sur la page de connexion, puis rediriger vers le Dashboard si OK (fallback attendu).	**Device compatible biométrie**
02	Interco / Données	Interconnexions bancaires – récupération infos (TOM10)	**Critique**	Connecter une banque et synchroniser les comptes/transactions via l'interconnexion. et **stocker/MAJ en BDD** + gérer timeout/limitation.	**Accès API BDF + règles sécurité + BDD**
02	IHM / Synthèse	IHM Tableau de bord (TOM11)	**Critique**	Consulter mon tableau de bord et informations clés de l'utilisateur (multi-banques). + bouton rafraîchir (appel BDF).	**Données issues TOM10**
02	Documents	Téléchargements relevés de compte (TOM12)	**Haute**	Télécharger les relevés de compte (PDF/CSV) selon les banques et périodes., **sans stockage BDD**.	**Accès API BDF + OS download**
03	Consultation	Interconnexions /Consulter les dernières transactions (TOM13)	**Haute**	Consulter un historique récent de transactions par banque avec accès rapide (BDF), **sans stockage BDD**.	**Accès API BDF transactions + Dashboard**
04	Suivi budget	Suivi de consommation (TOM04)	**Critique**	Visualiser la répartition des dépenses (catégories) et suivre l'évolution par période paramétrable.	**Transactions accessibles (direct ou via BDF)**
05	**Assistance**	**Conseiller virtuel (TOM15)**	**Haute**	Bulle accessible partout pour Obtenir des recommandations/alertes basées sur les données, avec cadre légal clair. Et redirection vers prise de RDV.	**Écran RDV + règles légales/UX**

PayForge

3.Méthodes de test adaptées

Tableau récapitulatif des méthodes de test retenues, en cohérence avec les risques et la criticité des fonctionnalités.

Fonctionnalité / Domaine	Scénario rapporté à la fonctionnalité	Criticité	Automatisation (cible)	Outils (exemples)	Justification
Création de compte & identités	Création compte + champs obligatoires/optionnels + éligibilité	**Critique**	**Partielle** (E2E sur parcours nominal + validations clés)	Playwright, checklists RGPD	Automatisation E2E pour valider rapidement les parcours d'inscription afin de Réduire le risque **fraude**, **non-conformité**, **erreurs de validation.**
Sécurité – MDP / lockout / session	Règles MDP + blocage + expiration session + récupération	**Critique**	**Partielle** (E2E + scénarios de blocage)	OWASP ZAP (scan), Playwright, rate-limit tests	Automatisation E2E pour valider rapidement **les parcours connexion** et détecter toute régression sécurité (MDP, lockout, session).
Authentification double facteur « 2FA »	2FA (succès/échec/expiration)	**Critique**	**Oui** (E2E sur 2FA)	Playwright,	Automatisation des parcours 2FA (succès/échec/expiration) afin d'assurer une expérience fluide et une sécurité stable à chaque sprint.
Authentification biométrie	Biométrie + Fallback	**Critique**	**Non**/Exploratoire biométrie	BrowserStack, tests devices	Exploration centrée utilisateur pour couvrir la diversité des devices/OS + fallback sécurisé.
Téléversement KYC	Upload justificatifs (formats/tailles) + erreurs + stockage/suppression RGPD	**Critique**	**Oui** (E2E upload + validations))	Playwright, antivirus/mock, règles stockage	Automatisation pour garantir la fiabilité des contrôles (formats, tailles, erreurs) et renforcer la sécurité des uploads de façon reproductible et les risque Risques **RGPD**
Interconnexions bancaires	Connexion banque + consentement/token + erreurs + retry + volumétrie	**Critique**	**Oui** (API + intégration)	Postman + Newman, mocks, Playwright smoke	Tests automatisés API/intégration pour fiabiliser les échanges, gérer erreurs/retry, sécuriser l'intégration (tokens, authent) et évite blocage
Dashboard (IHM)	Conformité avec la maquette et les règles de gestion + états vides + données incomplètes	**Critique**	**Oui** (contrôles E2E principaux)	Playwright, assertions calculs, snapshots	Automatisation des contrôles UX + cohérence data : limites erreurs de calcul, régressions visuelles, états "banque KO".
Transactions & recherche	Consulter les dernières transactions + filtre/tri/recherche + pagination	**Élevée**	**Partielle** (E2E sur recherche/filtre)	Playwright, tests dataset volumineux	Scénarios réels (banques incomplètes, transactions manquantes, délais, tri) + qualité UX, réduit bugs de volumétrie/pagination.
Téléchargement relevés	Export PDF/CSV + contenu minimum + limites de période/téléchargements	**Élevée**	**Oui** (E2E export + vérifs basiques)	Playwright, contrôles fichiers, scripts	Évite exports massifs, garantit formats attendus, contenu minimum, et non-régression sur génération/téléchargement
Suivi conso & catégorisation	Catégories dépenses + correction manuelle + graphiques + périodes	**Critique**	**Partielle** (tests calculs + E2E sur vues clés)	scripts dataset, Playwright, perf checks	Garantit **justesse métier** (calculs/graphes) + performance acceptable sur volumes réalistes.
Conseiller virtuel	Recommandations + fréquence recalcul + disclaimers légaux	**Critique**	**Non** / Partielle (selon IA)	Checklists légales, jeux de données contrôlés	Exploration pour évaluer la pertinence des recommandations + Risque **juridique** : vérifie cohérence, non-trompeur, messages obligatoires, limitation de conseil
Accessibilité & compatibilité	WCAG/ARIA + navigateurs/OS cibles (V1)	**Élevée**	**Partielle** (a11y automatisable))	Axe/Lighthouse + BrowserStack	Réduit risque de non-conformité, améliore adoption, sécurise avant mise en prod (multi-OS/navigateurs).

4.Ressources nécessaires

Pour mener à bien la campagne de test, nous comptons utiliser les ressources suivantes :

Équipe de Test Agile de la DSI :

- Boukersi Aomar : TEST Lead, chargé de la conception, exécution, suivi et reporting des tests Go/No-Go QA.
- Elsa (PO) : validation fonctionnelle, arbitrage périmètre V1 et priorisation.
- Équipe technique : correction anomalies, support intégration, revue des critères d'acceptation, support debug.
- RSSI / Conformité RGPD : validation sécurité, traçabilité, conservation des données.

Outils de gestion et de collaboration :

- GitHub : gestion de versions et collaboration via Git.
- Xray : recueille des cas de test + le suivi du bilan.
- Documentation : Confluence / Notion - décisions, exigences, PV de recette.
- Jira (ou Trello) : planification, exécution et suivi des tests/anomalies (tickets, kanban).
- Microsoft Teams : communication et coordination des rituels Agile.

Outils de test automatisé :

- Cypress : Framework de test automatisé pour exécuter des tests end-to-end.
- Playwright (option) : alternative pour couverture multi-navigateurs et exécution CI rapide.

. Newman pour exécution automatisée des tests des API en CI.

Environnement de test :

- Docker : création d'environnements de test dédiés ou virtualisés.
- BrowserStack : simulation de tests sur différents mobiles/OS/navigateurs.
- Firebase : base de données de test pour vérifier les interactions avec la base de données de l'application (selon architecture).
- Postman : tests des API.
- Ressources matérielles : serveurs et postes de travail pour déployer et exécuter les tests.

Ressources supplémentaires :

- Jeux de données de test (JDD) préparés sans données sensibles (pseudonymisation) pour éviter toute fuite :
  - ✓ Comptes de test multi-profils (utilisateur standard, utilisateur non éligible, comptes multi-banques)
- Visual Studio Code (VSCode) : IDE pour simplifier la rédaction et le débogage des tests.
- Matrice de traçabilité Exigences → Tests → Anomalies pour piloter la couverture

5.Étapes clés de la stratégie

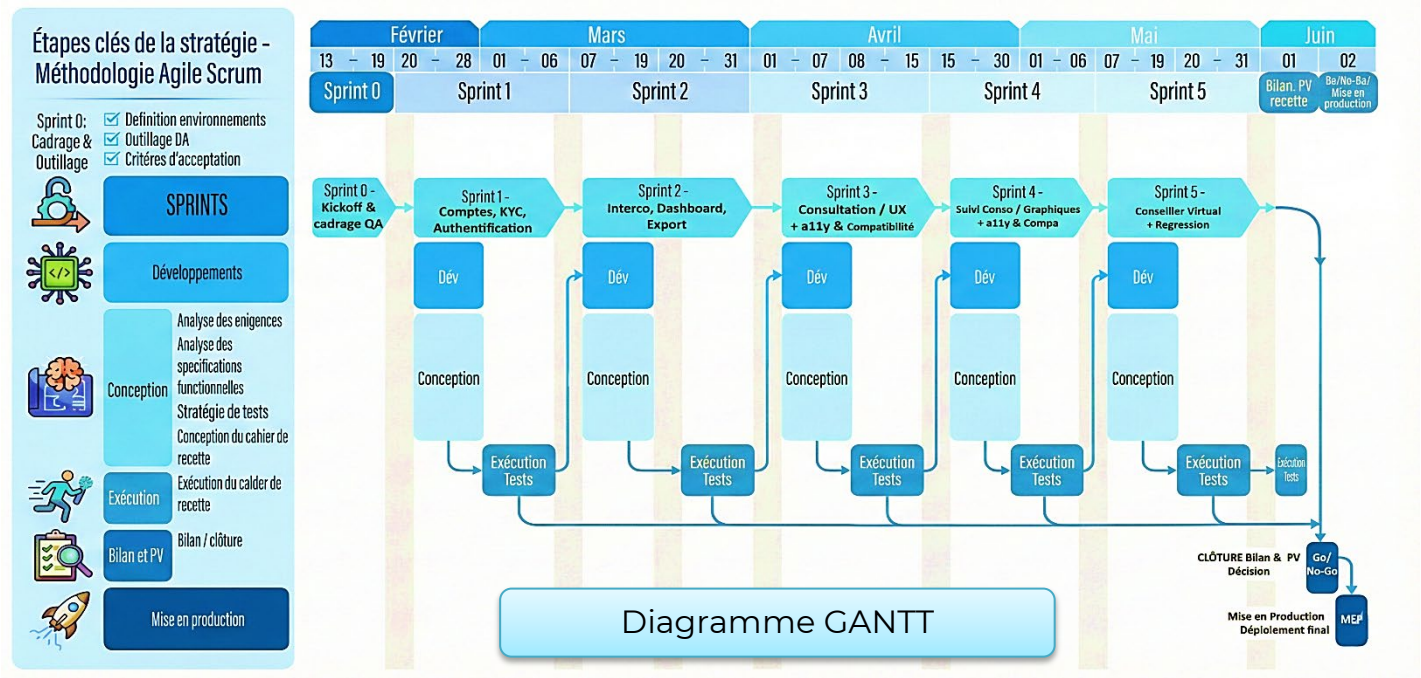

Les jalons du projet ont été articulés en fonction des sprints, avec une concentration des fonctionnalités principales du site sur les deux premiers sprints. Le projet suit une approche Agile, avec des sprints de deux semaines, ce qui favorise la réactivité et l'adaptabilité aux besoins changeants.

Jalons et livrables QA :

Jalon	Moment	Regroupe	Livrables / sorties attendues (compact)
J1	**Fin Sprint 1**	Conception + Exécution	Cahier de recette **S1** + **JDD**, exécution tests, preuves, anomalies, **traçabilité MAJ**
J2	**Fin Sprint 2**	Conception + Exécution	Cahier de recette **S2** + **JDD**, exécution tests, preuves, anomalies, **traçabilité MAJ**
J3	**Fin Sprint 3**	Conception + Exécution	Cahier de recette **S3** + **JDD**, exécution tests, preuves, anomalies, **traçabilité MAJ**
J4	**Fin Sprint 4**	Conception + Exécution	Cahier de recette **S4** + **JDD**, exécution tests, preuves, anomalies, **traçabilité MAJ**
J5	**Fin Sprint 5**	Conception + Exécution + Régression	Cahier de recette **S5** + **JDD**, exécution **S5** + **régression** (E2E/API/a11y), preuves, anomalies, **traçabilité MAJ**
J6	**Avant mise en prod**	Bilan + Go/No-Go + MEP	**Bilan final** (couverture/risques/indicateurs) + **PV Go/No-Go**, critères de sortis OK (**0 critique bloquante**, risques acceptés, couverture mini atteinte)

6. Processus de test

6.1 Organigramme

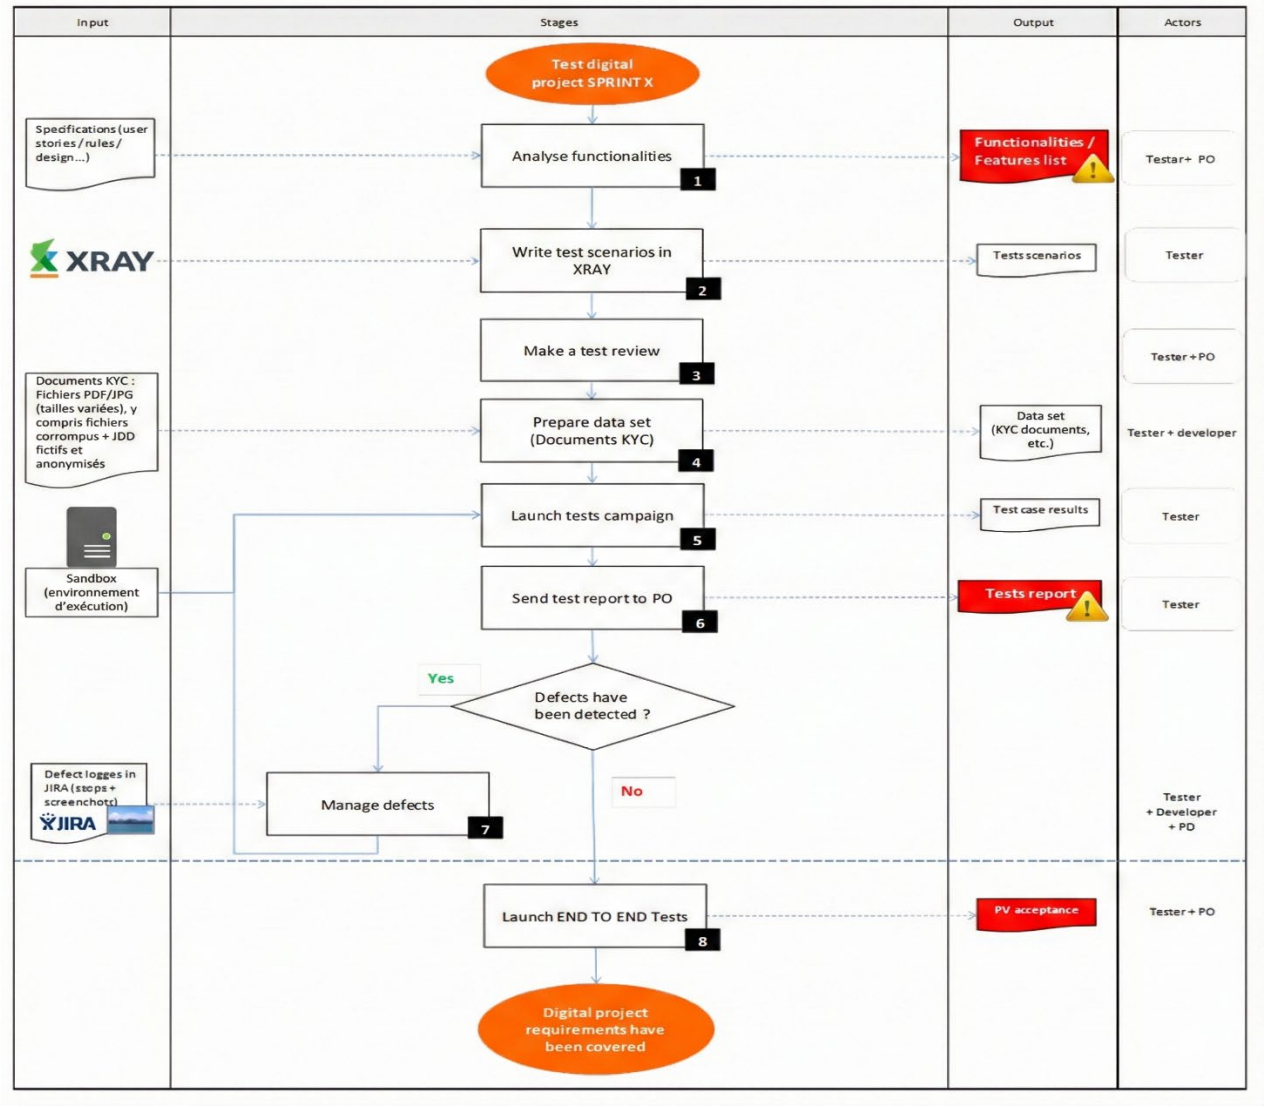

7. Risques du projet

7.1 Liste des risques

ID	Risque	Niveau	Plan de mitigation
R1	Exigences ambiguës (KYC, mot de passe, 2FA, calcul solde)	Élevé	Ateliers de clarification + validation PO/Conformité + critères d'acceptation détaillés
R2	Instabilité / indisponibilité des environnements	Élevé	Environnement de test isolé + monitoring + procédure d'escalade
R3	Dépendance aux API banques / sandbox	Élevé	Mocks/Simulations + tests de résilience (retries, messages, logs)
R4	Non-respect des objectifs (100% critique / 85% reste)	Élevé	Priorisation stricte + gel des critiques avant non-régression + smoke automatique
R5	Données personnelles / RGPD (documents)	Élevé	JDD anonymisés + politique de purge test + contrôles d'accès

R6	Interférence avec une fonctionnalité livrée par une autre équipe	Moyen	Campagne de non-régression ciblée sur parcours critiques + smoke avant release

7.2 Critique des exigences

La synthèse des exigences indique 8 blocs fonctionnels, dont 5 blocs critiques et 3 blocs à criticité élevée. Les points ambigus doivent être levés avant la validation finale des parcours critiques.

8.Préconisations

Préconisations (actions recommandées pour réduire les risques et sécuriser la V1) :

- **Shift-left : revue d'exigences systématique**
  Revoir les exigences en amont (ambiguïtés, RGPD, sécurité) avant le démarrage du développement.
- **Vérification de la disponibilité et de la sécurité de l'API BDF**
  Surveiller régulièrement l'API, sécuriser l'URL en HTTPS, prévoir un mode dégradé et des mécanismes de reprise (retry/backoff) en cas d'indisponibilité.
- **Renforcer la capacité QA (binôme)**
  Prévoir un second testeur ou un renfort ponctuel pour réduire la dépendance à une seule ressource et sécuriser la continuité.
- **Implémenter la double authentification (2FA)**
  Finaliser la 2FA en V1 (canal à confirmer) avec expiration, nombre d'essais, récupération et contrôle des actions sensibles pour limiter les accès non autorisés.
- **Définir très tôt les règles de sécurité**
  Encadrer les règles MDP, 2FA, biométrie, journalisation avec le RSSI pour éviter du rework.
- **Adapter l'application au format responsive**
  Adapter l'IHM au mobile (prise de photo, upload KYC) et valider la compatibilité multi-devices pour améliorer l'expérience utilisateur.
- **Intégrer un champ de suggestion pour les banques**
  Ajouter une recherche/autocomplète lors de l'enregistrement des banques pour réduire les erreurs de saisie et améliorer la précision.
- **Récapitulatif des données personnelles (RGPD)**
  Proposer un écran permettant de visualiser, modifier ou supprimer les données personnelles afin d'améliorer la transparence et respecter les droits RGPD.
- **Mettre en place une base JDD stable et non sensible (seed)**
  Utiliser un jeu de données reproductible (ex. Docker) pour fiabiliser les tests.
- **Automatiser en priorité les parcours critiques**
  Cibler l'inscription/login, 2FA, connexion banque, Dashboard, exports de relevés.
- **Budgets de performance et accessibilité**
  Définir des objectifs (temps de réponse, disponibilité) et une checklist accessibilité/compatibilité, puis les vérifier avant le Go/No-Go (BrowserStack,

tests perf).

9. Annexes

9.1 Glossaire

Terme	Définition
KYC	Know Your Customer : verification d'identité client
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données
2FA	Double authentification (ex : code SMS)
a11y	**"accessibility"** (accessibilité) : c'est une abréviation.
E2E	End-to-End : test de bout en bout
Smoke test	Test rapide pour vérifier que les fonctions principales tiennent

9.2 Liste des configurations à tester

Canal	Navigateurs / Apps	OS / Terminaux
Web	Chrome (N-1), Edge (N-1), Firefox (N-1)	Windows 10/11
Mobile	Safari iOS (N-1), Chrome Android (N-1)	iOS (N-1), Android (N-1)
Sécurité	2FA (SMS), biométrie (Face ID/TouchID/Android)	Selon Device supportés
